懸案事項確認表(施設建設の部)

平成28年10月15日
地域連絡協議会資料

更新日付け:2016/07/09

No.	打合せ日付け	No.	回答希望内容	回答希望日	回答部門	回答日付け	No.	途中経過回答内容	審議最終回答	審議終了日付け
1	2016/3/12	8.4	~~プラゴミ測定回数(2回必要(No.11と同一)~~	指定なし	ゴミ対策課				実施する	2016/7/9
2		8.1	事故等による長期停止の際の対応;設備二重化しない為	半年以内	衛生組合					
3			新燃焼システムの2回測定	指定なし	3市で検討					
4		8.3	排ガス対応;桜苑側も検討	指定なし	衛生組合					
5		8.2	プラザ施設の内容明確化	指定なし	衛生組合	H28.3.12	1	研修室・展示室・自由スペースを設		
6			大気汚染電光掲示板の設置	指定なし	衛生組合	H28.4.9	23,29	敷地内の外部から見易い所に設置		
7			~~出入り口の回転灯設置~~	指定なし	衛生組合				設置する	2016/7/9
8			新燃焼システム協議会の地域拡大	指定なし	東大和市					
9			議事録のホームページへのアップ状況	4月打ち合わせ	衛生組合					
10		8.2	建物の高さの具体的提案	4月打ち合わせ	衛生組合	H28.4.9	22	24mはまだ決定ではない。		
11	2016/4/9	7	計量機の2重設置化の実施	指定なし	衛生組合	H28.4.9		メーカー提案で2基もあり得る。	未確定	
12		8	ピット内の24H吸引稼働野の対応策	指定なし	衛生組合	〃		操業時間内のみ吸引。ピット内にはゴミが残るが、定期的に清掃。	設備的には稼働可能	2016/7/9
13		17,36	近隣環境の定期的な測定の具体案の提案	指定なし	衛生組合	〃		測定は敷地境界、排気口で行う。		
14		18	市民参加型チェック体制の確保の具体案提案	指定なし	衛生組合	H28.3.12		連絡協議会を母体とし、協議会との協議により決定。		
15		25,40	騒音問題;業者建物引き渡し時測定データを求める	指定なし	衛生組合	H28.4.9		認。		
16		26	換気ダクトの設置方向	指定なし	衛生組合	〃		設置位置は建屋中央部。排気方向は協議会の意見で決定。		
17		31	インターネットでの測定値のリアル公開	指定なし	衛生組合	〃		電光表示装置で行う。インターネットでは行わない。(住民側意見:やってほしい。)		
18		32	異常数値発生時の広報マニュアルの具体案の提案	指定なし	衛生組合	〃		対策マニュアルを作成する。		
19		33	花粉の出ない植栽;具体的な植栽案提案	指定なし	衛生組合	〃		花粉の種類を教えてほしい。(住民側意見:行政側に提案してほしい。)		
20		39	2階構造を厳守	指定なし	衛生組合	〃		3階構造だが、3階建てではない。		
21	2016/5/14 議事録	3.5		6月11日					「小平市の組成分析調査結果について」で小平市が回答	2016/6/11
22		3.7	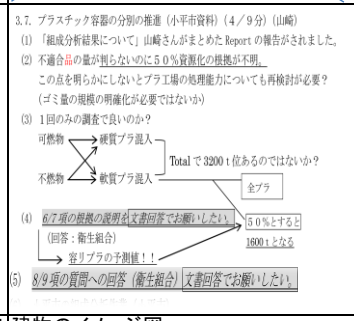	指定なし						
23		3.4	建物のイメージ図	6月11日					対象図面の提示	2016/6/11
24	2016/7/9 議事録	3.2.2(3)	生活環境調査説明会の開催	組合側から提示						
25		3.2.2(6)	現施設解体後のプラゴミ民間委託先及びビン、缶の処理方法⇒　東大和市	指定なし						
26		3.2.2(8)	建設スケジュールの提示	定期的						
27										
